

Oficio: UIET/REC/311/2018

Asunto: Envío de informe

Pob. Oxolotán, Tacotalpa, Tab., a 08 de noviembre de 2018

DR. SALVADOR MALO ÁLVAREZ
DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
PRESENTE.-

AT'N. MARÍA DEL ROCIO CHAVEZ MAYO
SUBDIRECTORA DE FOMENTO INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Por medio del presente, envío el informe del mes de octubre 2018, correspondiente al programa del **Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2018** con la finalidad de atender a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos federales asignados. Anexo se envía copia de la entrega de la obra por parte del Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa. Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

"SABER Y HACER PARA ENGRANDECER NUESTROS PUEBLOS"



Mtra. Adela Méndez Martínez
Rectora



C.c.p. Lic. Moisés Robles Cruz.- Coordinador General de Educación Intercultural y Bilingüe CGEIB-SEP
Mtra. María de Lourdes Casillas Muñoz.- Directora de Educación Media Superior y Superior CGEIB-SEP
Mtra. Adriana Jiménez Miranda.- Directora de la División de Planeación, Desarrollo y Evaluación UIET.
Arq. Emmanuel Hernández Espinosa.- Jefe del Depto. de Proyectos Estratégicos.
Archivo/minutario.
AMM/lor*

2018
AÑO

FAM
FONDO DE ADAPTACIONES MULTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
oct-2018
Fecha del corte: 31/10/18

REPORTES DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL
DATOS DE LA INSTITUCIÓN

Nombre: **Universidad Intercultural del Estado de Tabasco**
Entidad Federativa: **Tabasco**
Clave Inst: **911 27NSU000W**

Nombre: **Mrs. Adriana Jiménez Méndez**
Cargo: **Directora de la Dirección de Planeación, Desarrollo y Evaluación**
Teléfono: **993 755690**
Correo electrónico: **ajimenez@uniat.com**

Nombre: **Arq. Emmanuel Hernández Estrada**
Cargo: **Jefe del Departamento de Proyectos Estratégicos**
Teléfono: **993 322134**
Correo electrónico: **proyectos_ies@uniat.com**

Nombre: **Arq. Emmanuel Hernández Estrada**
Cargo: **Jefe del Departamento de Proyectos Estratégicos**
Teléfono: **993 322134**
Correo electrónico: **proyectos_ies@uniat.com**

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

Proyecto	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto			Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Avance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto			Acciones que sustentan el avance*	% de avance*	Fechas*		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurado? (Causas)	Cuenta con Actas								
		Obras de construcción	Adaptaciones y mejoras	Proyecto sustentable				Equipamiento	cantidad	metros cuadrados			Inicio	Termino			Si se fue inaugurada	¿Cuenta con los datos del evento?	¿Cuál y cuándo inauguró?	Entrega Recepción (Acta de Entrega-Recibo)	Acta Administrativa de Entrega-Recibo	Monto de Acta Administrativa			
1	Construcción de la 1ª Etapa del Edificio Académico tipo II de la Unidad Académica de Villa Fernando de las Sabanas, Centro.	X			\$ 2,157,676.68	\$ 2,054,552.68	\$ 123,124.20	3	133.00	48.00	133.00	ARMADO Y COLADO DE CEMENTO PARA EL BLOQUE RELLENO DE CEPHE	100%	10/07/18	28/10/18	Se reportó de que en cada los columnas se les rellenan los bloques de concreto con material de relleno de cemento. Se reportó que se rellena con bloques de cemento para el relleno de los bloques de concreto. El Gobierno del Estado se reportó que se rellena con bloques de cemento para el relleno de los bloques de concreto. Se reportó que se rellena con bloques de cemento para el relleno de los bloques de concreto.	No								
TOTAL								6	318.00	0	\$18.00														

\$2,157,676.68

\$2,054,552.68

\$123,124.20

Nombre y firma del Jefe del Taller de la IES
M.A.P. Adriana Jiménez Méndez

Nombre y firma del Jefe del Taller de la IES
Arq. Emmanuel Hernández Estrada

* Monto del recurso autorizado, no incluye con el monto del evento/colado.
1 Se capturan los aspectos que concierne a la obra o proyecto. Se podrán anexar hasta las fotos que sean necesarias.
2 En esta ejecución se midieron de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se van reflejados en el reporte fotográfico.
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: día, mes y año.

Nombre y firma del Jefe del Taller de la IES
Arq. Emmanuel Hernández Estrada

2018

FAM

FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Oct-2018

Reporte de avance mensual

1






Número de la obra:

Construcción de la 1ª Etapa del Edificio Académico tipo II de la Unidad Académica de Vías Transmít de las Sabanas, Centre.



Matriculación
Porcentaje de avance

100%

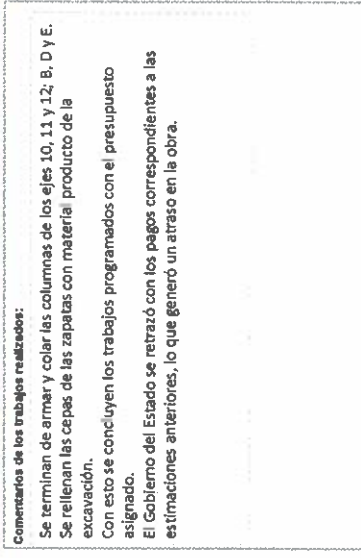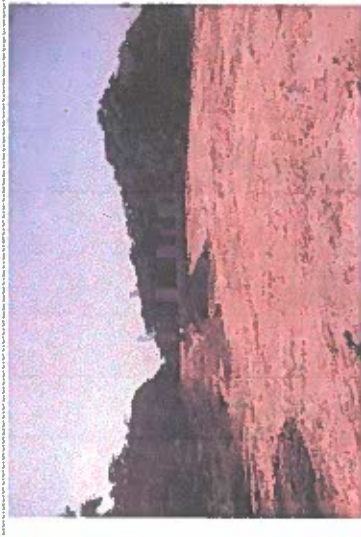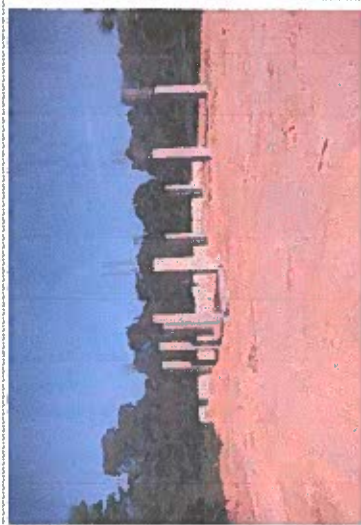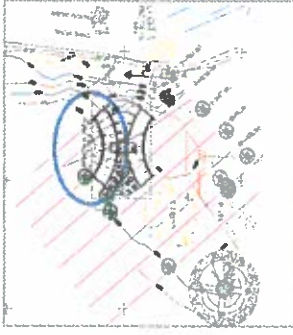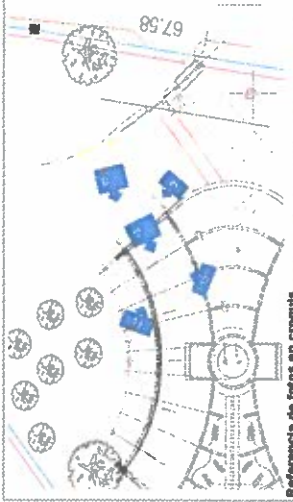


FOTOS

Comentarios de los trabajos realizados:

Se terminan de armar y colar las columnas de los ejes 10, 11 y 12; B, D y E.
Se rellenan las cepas de las zapatas con material producto de la excavación.
Con esto se concluyen los trabajos programados con el presupuesto asignado.
El Gobierno del Estado se retrasó con los pagos correspondientes a las estimaciones anteriores, lo que generó un atraso en la obra.

F1: Fachada posterior

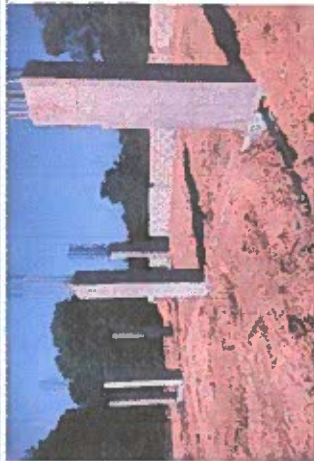

F2: Fachada posterior

Nombre y firma del Trabajador de la IES

F3: Interior



F4: Interior



F5: Interior de aula

Nombre y firma del Trabajador de Obras y Mantenimiento de IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pastilla, se podrán copiar tantas pastillas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

Siendo las 10.25 horas del día 26 del mes de Octubre del año 2018, se reúnen en la Escuela UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO, ubicada en TAMULTE DE LAS SABANAS, municipio de CENTRO, TABASCO, con C.C.T.27EIU0003D; el C. ING. LUIS ALBERTO ALVAREZ CARRERA, Residente de Obra por parte del Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa (ITIFE), el C. ING. WILIAM DE JESUS MEDINA CAAMAL, Superintendente de Construcción por parte de la contratista INGENIERIA RML S.A. DE C.V., y el (la) C. Ing. EMANUEL HERNANDEZ ESPILOSA Director(a) o Encargado(a) de la Escuela en cuestión, con la finalidad de que la escuela en mención reciba oportunamente el inmueble en condiciones de operación producto del contrato número COEDP79-076/18, referente al proyecto No. EDP79, para la realización de los trabajos de: CONSTRUCCION DE LA 1RA. ETAPA DEL EDIFICIO ACADEMICO TIPO II DE LA UNIDAD ACADEMICA DE VILLA TAMULTE DE LAS SABANAS DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO CON CLAVE 27EIU0003D UBICADA EN TAMULTE DE LAS SABANAS MPIO. DE CENTRO TABASCO. Lo anterior, con fundamento al artículo 71 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco (LOPSRMET), por lo que se formula la presente Acta Minuta de Recepción de Obra Terminada por parte del Área Operativa (Escuela), procediendo a verificar físicamente la existencia y correcta ejecución de los siguientes puntos:

- 1.- RELLENO
- 2.- CIMENTACION
- 3.- ESTRUCTURA

Asimismo, se hace entrega (al / a la) Director(a) o Encargado(a) responsable de la escuela, la siguiente documentación
Ninguna

Cabe mencionar que con fundamento al Artículo 72 de la Ley antes mencionada, a partir de este momento el inmueble y los trabajos relativos al contrato en mención, quedan bajo la responsabilidad de la escuela, por lo que deberán de asegurar las acciones necesarias para mantenerla en los niveles apropiados de funcionamiento, salvo en el caso de que por algún



Gobierno del Estado de Tabasco



Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa

**ACTA MINUTA
ENTREGA OBRA TERMINADA
AL ÁREA OPERATIVA
ESTATAL**



Tabasco
cambia contigo

vicio oculto en la ejecución de los trabajos exista la necesidad de que la contratista responda por dichos defectos.

Por tal razón y por todo lo anteriormente expuesto en la presente Acta minuta, las partes están de acuerdo en la Recepción de Obra Terminada por el área operativa.

Siendo las 11:45 horas del mismo día en que inició la presente acta minuta, y sin más puntos por atender, se da por terminada la misma.

~~C. Ing. Luis Alberto Álvarez Carrera
Residente de Obra por el ITIFE~~

C. Ing. William de Jesus Medina Caamal

**Superintendente de Construcción
De la Empresa**

CARD. EMANUEL HERNANDEZ ESPINOSA
JAPS DE PROYECTOS ESTRATEGICOS

**Director(a) o Encargado(a) de la
Escuela**

