

Correo electrónico: dir.planeacion@uiet.edu.mx

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Enero/Marzo

FECHA DE CORTE: 31/03/2023

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: Universidad Intercultural del Estado de Tabasco Entidad federativa: Tabasco UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO

Clave Inst 911: 27MSU0009N RESPONSABLES Planeación Obras y Mantenimiento Nombre: Mtra. Adriana Jiménez Miranda Nombre: Arq. Elena Gpe. Vega Narváez Cargo: Jefe de Departamento de Proyectos Estratégicos Cargo: Directora de Planeación, Desarrollo y Evaluación Teléfono: 9933 765690 Teléfono: 9933 875630

| | DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO | | | | | | | | | | | | | | | OBRA CONCLUIDA | | | | | |
|-----------|---------------------------------|--|--|----------------|-----------------|--|----------|---------------------|--|--|-----------------|---------------------|-------------|---------------|--------------------------------|-----------------|---|------------------|--|---------------------------------|--|
| | | Tipo de proyecto | | Monto ejercido | Remanente | Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto 1 | | | | | | Fechas ³ | | | ¿Es | Si ya inaugu | | Cuenta con Actas | | Actas | |
| Prioridad | Nombre del proyecto | Obra de continuidad Equipamiento Adecuaciones y mejoras Mantenimiento | Proyecto sustentable Proyecto sustentable | | | Espacio/equipo | cantidad | metros cuadrados | Acciones que sustentan el avance ² | que Acciones por sustentan el realizar | or % de avance* | Inicio | Término | Observaciones | susceptible de ser inaugurada? | | | Recepcion | Acta Administrat iva de Entrega- Recepción | Monto de Acta Administrativa | |
| | | | | | | CUBÍCULOS | 9 | 60.00 | | | GLOB | | OYECTO | | | | | 1 | 1 | | |
| | Cuarta etapa del Centro de | | | | | OF. ACADÉMICA | 4 | 35.00 | CONEVIÓN | -> | | | | | | | | 1 | 1 | | |
| | Integración y Recreación | | | | | | | | CONEXIÓN ELÉCTRICA Y | , | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | |
| | Intercultural en la Universidad | | \$ 2,740,794.00 | \$ - | \$ 2,740,794.00 | | | | CANCELERÍA | Construcción | 0% | Por definir | Por definir | | | | 1 | 1 | 1 | | |
| | Intercultural del Estado de | | | | | | | | INTERIOR | | | l or domin | | | | | | | ļ | | |
| | Tabasco Oxolotán, Tacotalpa. | | | | | | 40 | 00 | | | | | | | | | | 1 | 1 | | |
| | | | | | | TOTAL | 13 | 95.00 | | | | | | | | | | | | | |

Correo electrónico: dpt.proyectos@uiet.edu.mx

Mtro. Alterio Ramos Pérez Pérez Nombre y firma del Titular de la IES

\$2,740,794.00

\$2,740,794.00

Arq. Elena Gpe Vega Narváez

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

^{*} Avance del recurso autorizado, no confundir con avance total del proyecto/edificio.

¹ Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta filas como sea necesario.

² En esta seección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se veran reflejados en el reporte fotográfico.

³ Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos digitos: dd, mm y aa.





Correo electrónico: dir.planeacion@uiet.edu.mx

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Enero/Marzo FECHA DE CORTE: 31/03/2023

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Teléfono: 9933 875630

Correo electrónico: dpt.proyectos@uiet.edu.mx

Nombre: Universidad Intercultural del Estado de Tabasco Entidad federativa: Tabasco UNIVERSIDAD INTERCULTURAL Teléfono: 9933 765690 DEL ESTADO DE TABASCO

Clave Inst 911: 27MSU0009N RESPONSABLES Planeación Obras y Mantenimiento Nombre: Arq. Elena Gpe. Vega Narváez Nombre: Mtra. Adriana Jiménez Miranda Cargo: Jefe de Departamento de Proyectos Estratégicos Cargo: Directora de Planeación, Desarrollo y Evaluación

| | DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO | | | | | | | | | | | | | | | OBRA CONCLUIDA | | | | | |
|-----------|---|--|-----------------|----------------|-----------------|---|----------|---------------------|------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|---------|--------------------|--|-------------------------|--|-----------|--|---------------------------------|--|
| | | Obra de continuidad Equipamiento Mantenimiento Proyecto sustentable Operation of the continuidad operation of the continuidad operation operat | | | Remanente | Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹ | | | | | | Fechas ³ | | | ¿Es | Si ya fue inaugurada | | | Cuenta con Actas | | |
| Prioridad | Nombre del proyecto | | | Monto ejercido | | Espacio/equipo | cantidad | metros cuadrados | | Acciones por realizar | % de avance* | Inicio | Término | Observaciones inau | susceptible de ser inaugurada? (Causas) | ¿Cuenta | | Recepción | Acta Administrat iva de Entrega- Recepción | Monto de Acta Administrativa | |
| | | | | | | Taller de Alimentos | 1 | 160.00 | | | GLOBAL DEL PROYECTO | | OYECTO | | | | | | | | |
| | Adecuación del Taller de | | | | | Edificio 2 | 1 | | Techado, | | | Por definir Por definir | | | | | | | | | |
| 2 | Alimentos, en la Universidad Intercultural del Estado de | | \$ 2,740,794.00 | \$ - | \$ 2,740,794.00 | | | 140.00 | Muros, | Construcción | 0% | | | | | | | | | | |
| | Tabasco Oxolotán, Tacotalpa. | | | | | | | | Cancelería | | • 70 | . 3. 33.77 | . 3. 33 | | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | 2 | 300.00 | | | | | | | | | | | | | |

Mtro. Alterio Ramos Pérez Pérez Nombre y firma del Titular de la IES

\$2,740,794.00

\$2,740,794.00

Arq. Elena Gpe dega Narváez

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

^{*} Avance del recurso autorizado, no confundir con avance total del proyecto/edificio.

¹ Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta filas como sea necesario.

² En esta seección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se veran reflejados en el reporte fotográfico.

³ Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos digitos: dd, mm y aa.



Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA


Mes reportado

Enero/Marzo FECHA DE CORTE: 31/03/2023

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Correo electrónico: dpt.proyectos@uiet.edu.mx



Entidad federativa: Tabasco Clave Inst 911: 27MSU0009N

RESPONSABLES Planeación Obras y Mantenimiento Nombre: Mtra. Adriana Jiménez Miranda Nombre: Arq. Elena Gpe. Vega Narváez Cargo: Directora de Planeación, Desarrollo y Evaluación Cargo: Jefe de Departamento de Proyectos Estratégicos Teléfono: 9933 765690 Teléfono: 9933 875630

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO **OBRA CONCLUIDA** Alcance del proyecto en cuanto a Si ya fue espacios físicos, metros cuadrados Fechas³ Tipo de proyecto Cuenta con Actas inaugurada y tipo de proyecto 1 Acciones susceptible de Acciones por % de que Nombre del proyecto Monto autorizado | Monto ejercido | Remanente Observaciones Acta ¿Cuenta ¿Quién y Entregasustentan el avance* realizar inaugurada? Pri Administrat avance 2 con fotos cuándo Recepción Monto de Acta (Causas) iva de Término Espacio/equipo cantidad Inicio Administrativa (Acta cuadrados inauguró Entregafiniquito) evento? Recepción **GLOBAL DEL PROYECTO** 144.00 Auditorio 240.00 Acervo 8.00 Cubículos Construcción de Biblioteca 96.00 Construcción Sanitarios Comunitaria en la Unidad Académica de Villa Vicente \$ 8,222,382.00 \$ \$ 8,222,382.00 de Biblioteca Construcción Por defnir Por definir y Auditorio Guerrero, Centla. TOTAL 488.00

> \$0.00 \$8,222,382.00 \$8,222,382.00

Mtro. Alterio Ramos Pérez Pérez Nombre y firma del Titular de la IES

* Avance del recurso autorizado, no confundir con avance total del proyecto/edificio.


1 Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta filas como sea necesario.

2 En esta seección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se veran reflejados en el reporte fotográfico.

3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos digitos: dd, mm y aa.

Arq. Elena Gpe. Vega Narváez

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

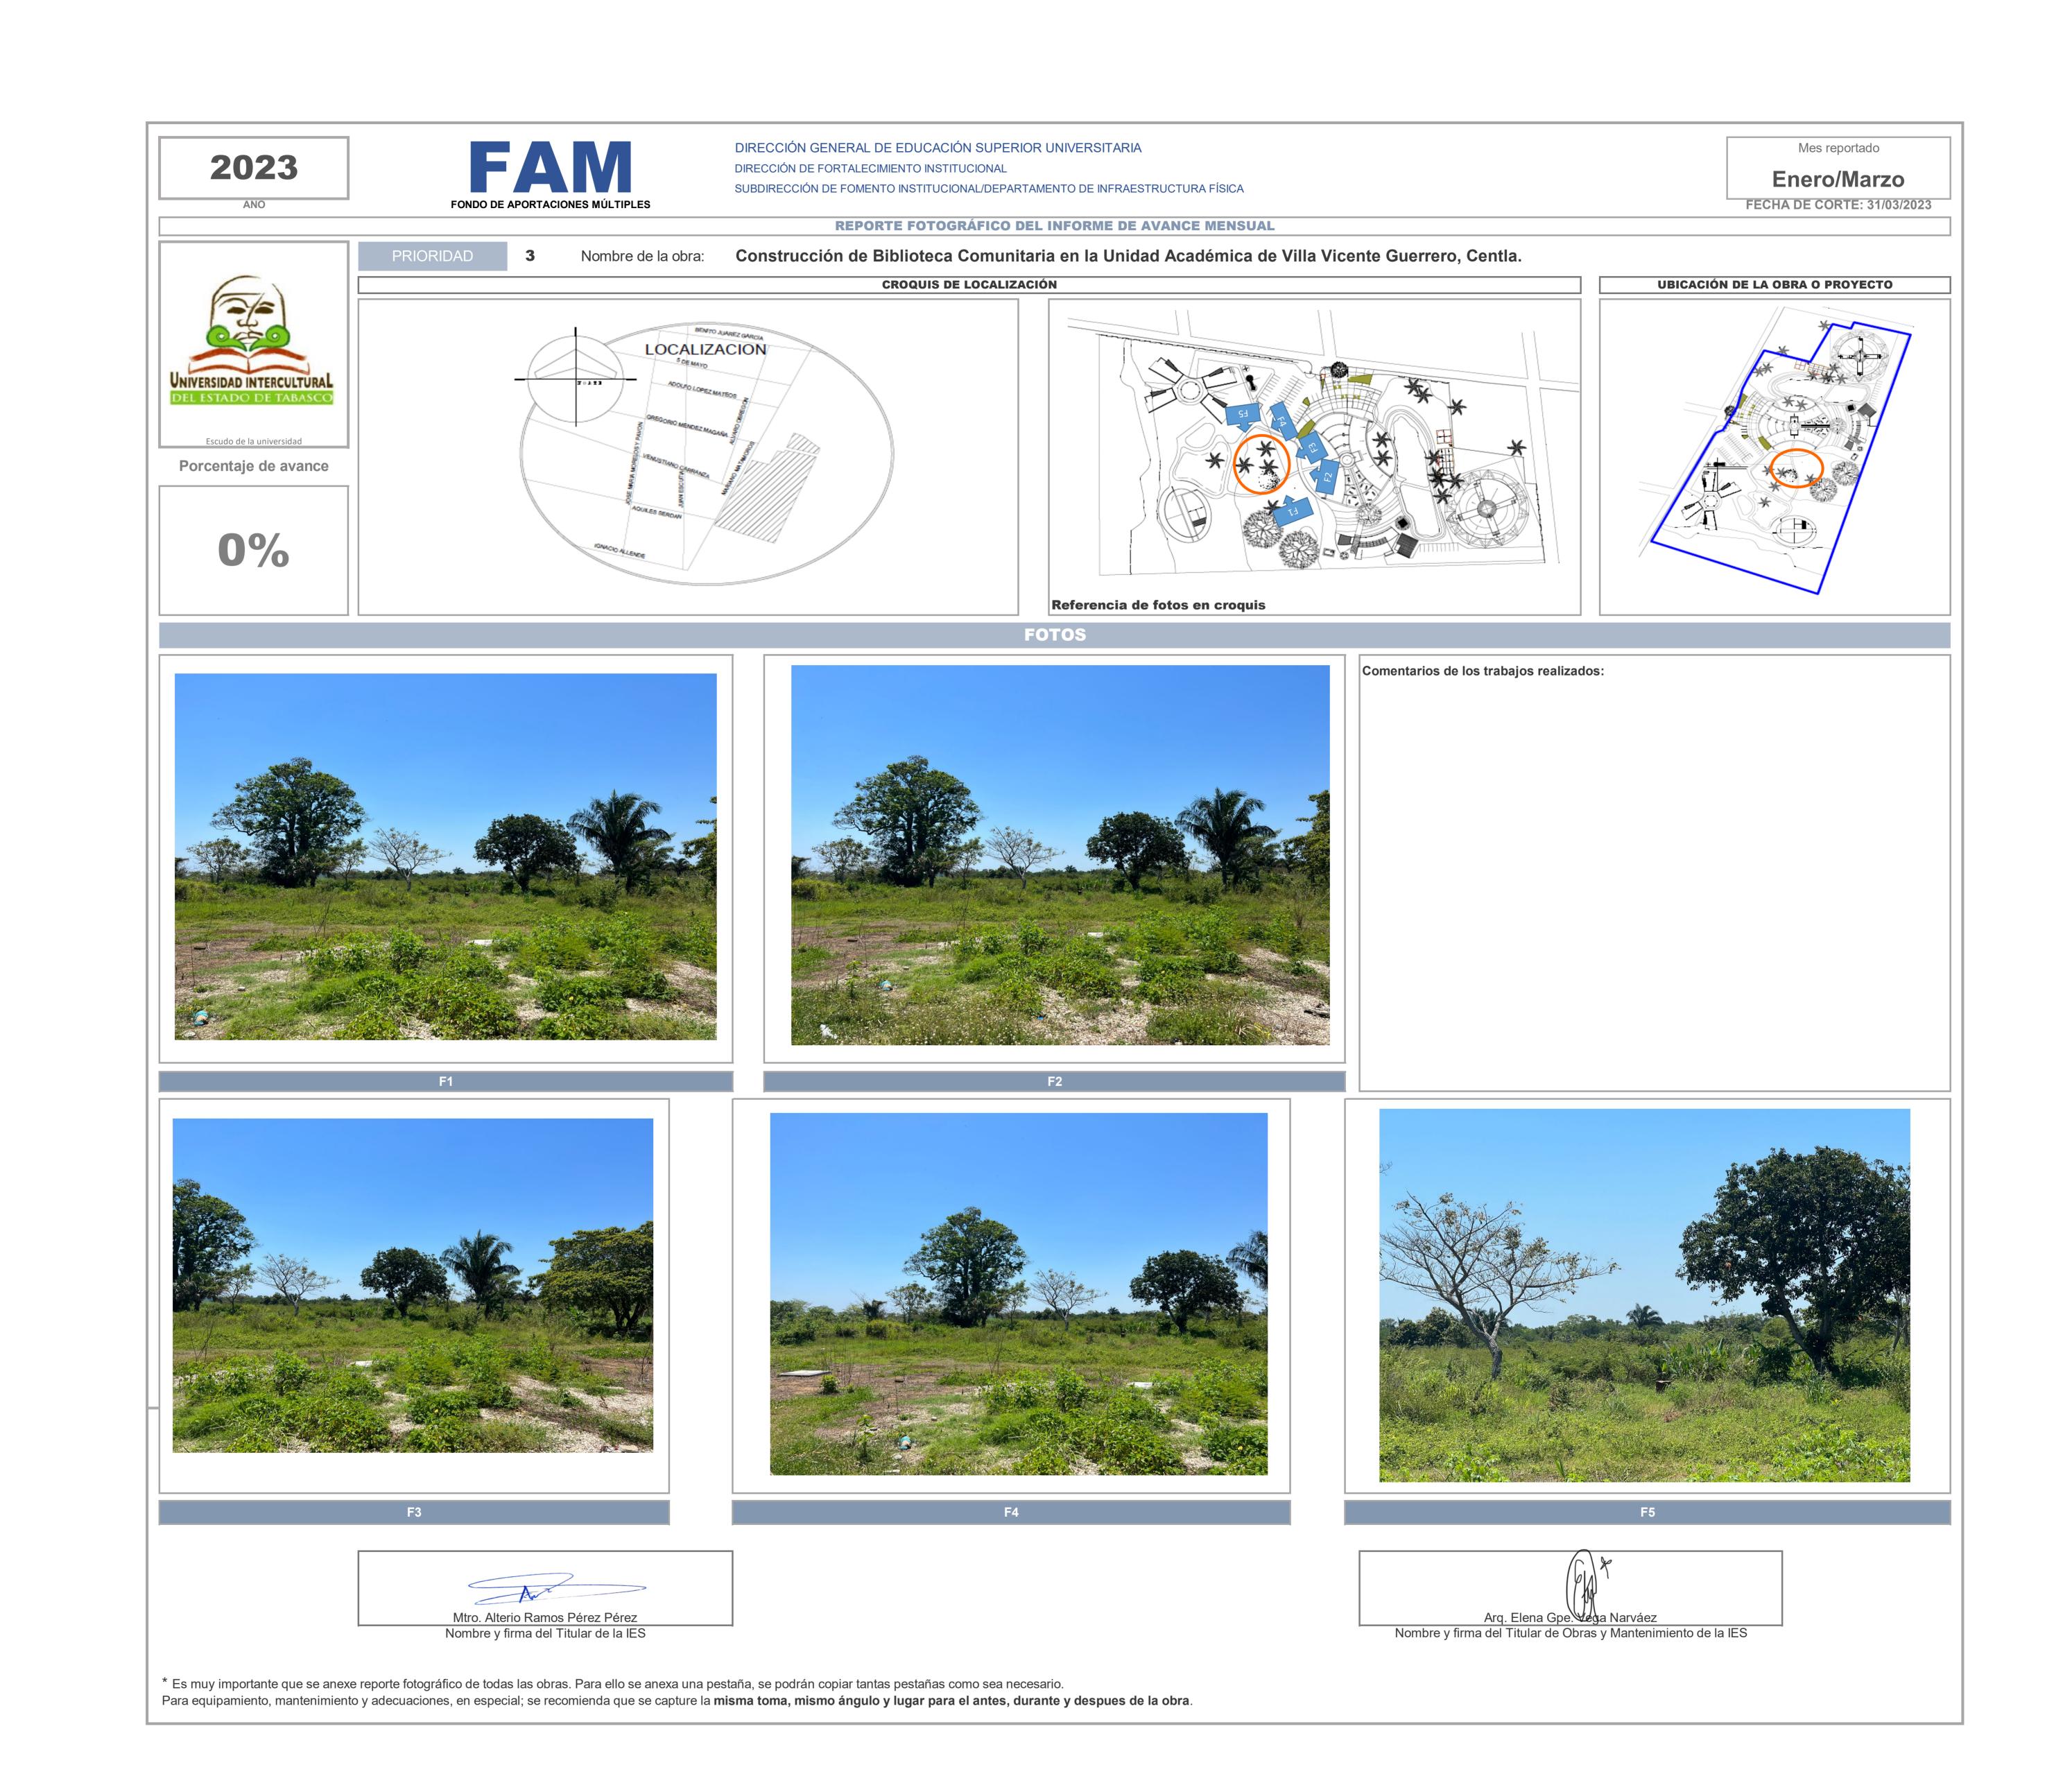

AÑO



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado


Enero/Marzo

FECHA DE CORTE: 31/03/2023

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

Correo electrónico: dpt.proyectos@uiet.edu.mx

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Clave Inst 911: 27MSU0009N

RESPONSABLES

Planeación

Nombre: Mtra. Adriana Jiménez Miranda
Cargo: Directora de Planeación, Desarrollo y Evaluación

Teléfono: 9933 765690

RESPONSABLES

Obras y Mantenimiento

Nombre: Arq. Elena Gpe. Vega Narváez
Cargo: Jefe de Departamento de Proyectos Estratégicos
Teléfono: 9933 765690

| | DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO | | | | | | | | | | | | | | | OBRA CONCLUIDA | | | | | |
|--|---|---------------------------------|-----------------|--|----------|---------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|-------------|---------------|--|-------------------------|--------------------|--------------------|--|---------------------------------|--|--|--|
| | Tipo de proyecto | | | Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto 1 | | | | | | Fechas ³ | | | ¿Es | Si ya fue inaugurada | | Cuenta con Actas | | Actas | | | |
| Nombre del proyecto | Obra de continuidad Equipamiento Adecuaciones y mejoras | Monto autorizado Monto ejercido | Remanente | Espacio/equipo | cantidad | metros cuadrados | Acciones que sustentan el avance 2 | Acciones por realizar | % de avance* | Inicio | Término | Observaciones | susceptible de ser inaugurada? (Causas) | ¿Cuenta con fotos | cuándo inauguró | Recepción (Acta | Acta Administrat iva de Entrega- Recepción | Monto de Acta Administrativa | | | |
| | | | | Auditorio | 1 | 144.00 | | | GLOB | LOBAL DEL PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| | | | | Acervo | 1 | 240.00 | _ | blioteca Construcción | 0% | | | | | | | | | | | | |
| Construcción de Biblioteca | , | | \$ 8,222,382.00 | Cubículos | 2 | 8.00 | _ | | | Por defnir | | | | | | | | | | | |
| Comunitaria en la Unidad | | A 0 000 000 0 | | Sanitarios | 1 | 96.00 | Construcción | | | | | | | | | | | | | | |
| Académica de Villa Tamulté de las Sabanas, Centro. | | \$ 8,222,382.00 \$ - | | | | | de Biblioteca y Auditorio | | | | Por definir | | | | | | | | | | |
| | | | | TOTAL | 5 | 488.00 | | | | | | | | | | | | | | | |

Mtro. Alterio Ramos Pérez Pérez Nombre y firma del Titular de la IES

\$8,222,382.00

\$8,222,382.00

1 Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta filas como sea necesario.


2 En esta seección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se veran reflejados en el reporte fotográfico.

3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos digitos: dd, mm y aa.

Arq. Elena Gpe. Vega Narváez

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

^{*} Avance del recurso autorizado, no confundir con avance total del proyecto/edificio.

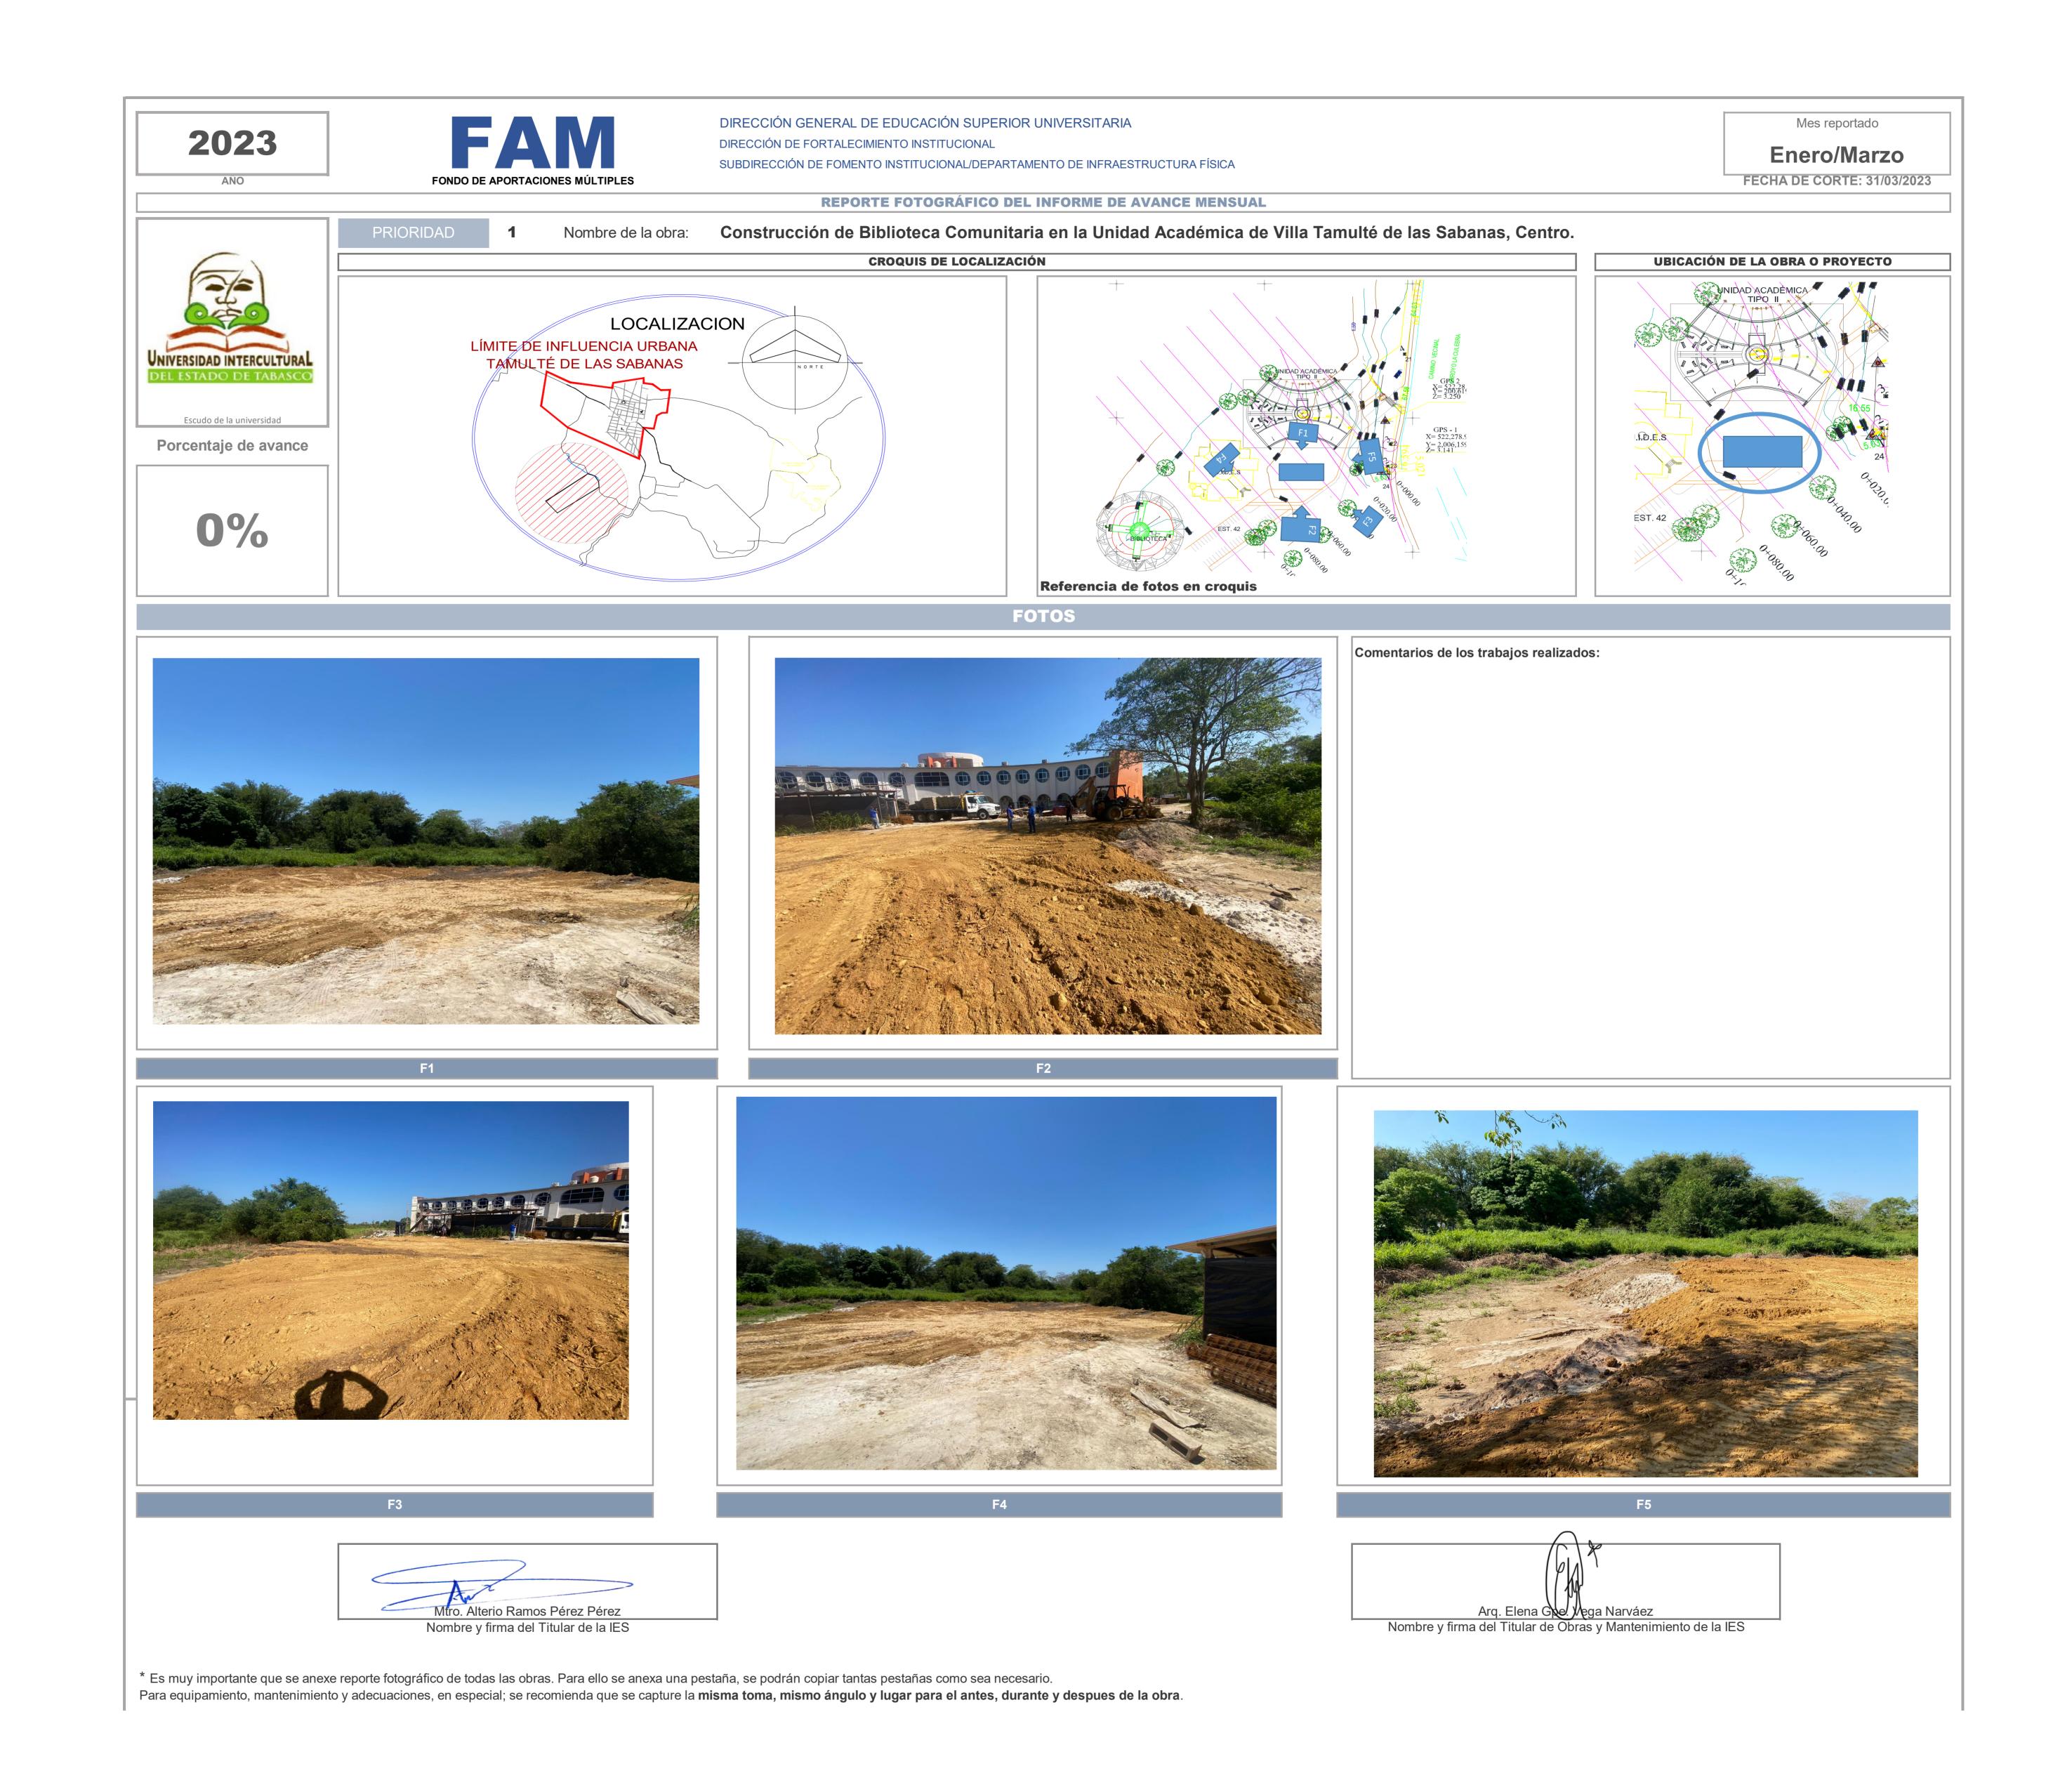



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Mes reportado

Enero/Marzo

FECHA DE CORTE: 31/03/2023

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: Universidad Intercultural del Estado de Tabasco Entidad federativa: Tabasco UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO

Clave Inst 911: 27MSU0009N RESPONSABLES Obras y Mantenimiento Planeación Nombre: Mtra. Adriana Jiménez Miranda Nombre: Arq. Elena Gpe. Vega Narváez Cargo: Directora de Planeación, Desarrollo y Evaluación Cargo: Jefe de Departamento de Proyectos Estratégicos Teléfono: 9933 765690 Teléfono: 9933 875630 Correo electrónico: dir.planeacion@uiet.edu.mx Correo electrónico: dpt.proyectos@uiet.edu.mx

| | DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO | | | | | | | | | | | | | | OBRA CONCLUIDA | | | | | |
|-----------|--|--|--|----------------|-----------------|--|----------|---------------------|--|-----------------------|---------------------------|---------------------|-------------|---------------|--|-------------------------|--|------------------|--|----------------|
| Prioridad | | Tipo de proyecto | | | | Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto 1 | | | | | | Fechas ³ | | | ¿Еs | Si ya fue inaugurada | | Cuenta con Actas | | Actas |
| | Nombre del proyecto | Obra de continuidad Equipamiento Adecuaciones y mejoras Mantenimiento | Proyecto sustentable opposition of the contract of the contrac | Monto ejercido | Remanente | manente Espacio/equipo | cantidad | metros cuadrados | Acciones que sustentan el avance ² | Acciones por realizar | or % de avance* | Inicio | Término | Observaciones | susceptible de ser inaugurada? (Causas) | ¿Cuenta | | Recepcion | Acta Administrat iva de Entrega- Recepción | Administrativa |
| | | | | | | | | | | ón Equipamiento | GLOBAL DEL PROYECTO | | OYECTO | | | | | | | |
| 5 | Adquisición de equipamiento y mobiliario en la Universidad Intercultural del Estado de | x | \$ 5,230,302.00 | 0 \$ - | \$ 5,230,302.00 | | | | Adquisición de equipamiento | | 0% Por definir Por defini | | | | | | | | | |
| | Tabasco, Oxolotán, Tacotalpa. | | | | | | | | | | | | Por delinii | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | 0 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |

Mtro. Alterio Ramos Pérez Pérez Nombre y firma del Titular de la IES

\$0.00

\$5,230,302.00

\$5,230,302.00

2 En esta seección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se veran reflejados en el reporte fotográfico.

3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos digitos: dd, mm y aa.

Arq. Elena Gpe. Vega Narváez

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

^{*} Avance del recurso autorizado, no confundir con avance total del proyecto/edificio.

¹ Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta filas como sea necesario.

