

Oficio No. UIET/REC/348/2024

Asunto: El que se indica

Poblado Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco a 07 de octubre de 2024

DR. EDUARDO GERARDO ROSAS GONZÁLEZ
DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
PRESENTE.-

Por medio de presente envío el informe de avances correspondientes al Tercer Trimestre Julio/Septiembre del Programa Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) ejercicio 2024, de los siguientes proyectos:

P1. 2da. Etapa de construcción de la Biblioteca Comunitaria y obra complementaria Unidad Académica de Villa Vicente Guerrero, Centla.

P2. 2da. Etapa de construcción de la Biblioteca Comunitaria obra complementaria Unidad Académica de Villa Tamulté de las Sabanas, Centro.

P3. 5ta. Etapa del Centro de Integración y Recreación Intercultural y obra complementaria en la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, Oxolotán, Tacotalpa.

Con la finalidad de atender a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos asignados. Anexo al presente se envía la documentación en formatos PDF y Excel.

Sin otro particular reciba un cordial saludo.

Atentamente

"SABER Y HACER PARA ENGRANDECER NUESTROS PUEBLOS"



Dr. Alterio Ramos Pérez Pérez
Rector



C.c.p. Mtra. Adriana Jiménez Miranda.- Directora de la División de Planeación, Desarrollo y Evaluación de la UIET.
Arq. Elena Guadalupe Vega Narváez, Jefa del Departamento de Proyectos Estratégicos UIET
Archivo ARPP/lor*

2024

UNIVERSIDAD DE LA GUAYANA

FAM

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta

3er. Trimestre 2024

Fecha de emisión: 07/10/2024

REPORTE DESCRITIVO DEL ESTADO DE AVANCE TRIMESTRAL

DATOS DE LA UNIDAD REPORTADA



Nombre: Universidad de la Guayana

Código de la unidad: 10000000

Código de la unidad: 10000000

Nombre: Ing. Diana Luciani Viquez

Cargo: Directora de Promoción Desarrollo y Evaluación

Teléfono: 962 788680

Correo electrónico: dpluciani@univguyana.edu

RESPONSABLES

OTROS RESPONSABLES

Nombre: Ing. Diana Luciani Viquez

Cargo: Jefe de Departamento de Proyectos Estratégicos

Teléfono: 962 788680

Correo electrónico: dpluciani@univguyana.edu

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBSERVACIONES

ID de acuerdo con el SOR	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto	CONTRATO Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA										Bases Económicas (Programas/Actividades)			Fechas Reporte		Observaciones	Licencia a la ISQR			Acta				
			Monto autorizado (A)	No. del Contrato (B)	Fechas Programadas		Monto Contratado (B)	Contratista	Monto no Contratado (C) Diferencia entre el monto autorizado y el monto de C.A.B.	Monto Ejecutado (B)	Monto Reportado (C) B + D	Actividades que sustentan el avance			% de Avance	Inicio	Fin		Límite de Cobertura	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Acta Administrativa de Entrega de la Obra (Borrador de la ISQR)	Fecha			
					Inicio	Fin						Monto Reportado	Utilidad	Monto Contratado										Fechas Reporte	Fechas Reporte	Fechas Reporte
					Inicio	Fin						Monto Reportado	Utilidad	Monto Contratado												
1	3do. Etapa de construcción de la Biblioteca Comunitaria y otros complementos Unidad Académica de Villa Vicente Guerrero, Conde.	A	\$ 6,875,782.00	COT000924-9/2024	05/08/24	31/12/24	\$ 6,330,874.5	Constructora y Comercializadora JAVANA, S.A. de C.V.	2 - 5,914.37	1,366,890.09	\$ 6,330,874.5	Actividades de construcción de la biblioteca comunitaria y otros complementos	39%	05/08/24	31/12/24	5.983.377,54										
			\$ 6,875,782.00						\$ 2,551,437.37	\$ 1,366,890.09	\$ 6,330,874.5															

1. Se elabora un informe de avance trimestral a la fecha de reporte. Se debe incluir el avance físico y financiero.

2. El avance físico se reporta en forma de porcentaje y se debe incluir el avance físico y financiero.

3. Es importante que los datos de avance físico y financiero sean consistentes. Se debe incluir el avance físico y financiero.

ALBERTUS MAGNUS, OP. 11, 12

FONDO DE APORTACIONES H.V., T.V., R.V.

SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

3er. Trimestre 2024

Fecha de elaboración: 07/10/2024

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Nombre de la obra

2da. Etapa de construcción de la Biblioteca Comunitaria y obra complementaria Unidad Académica de Villa Vicente Guerrero, Centla.

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

**UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON
FOTOS REFERENCIADAS**



Preservação de espécies

28%



Dirección Postal: AMPUS Vicente Guerrero, Calle
Manano Matamoros s/n entre calle Gregorio
Méndez Magaña, Vlla Vicente Guerrero, Centla,
Tabasco, C.P. 86761

FOTOS



Observaciones:

En observaciones,



Arg. Elvén, Vega Narvøe
 Jefe del Departamento de Astrofísica
 ODESA

1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677,

WILLIAM H. BARNES, JR., PRESIDENT

MOTA

Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestana, se podrán copiar tantas pestanas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

020000-934, 04 05 576

DEFECTION DE COFFAÏÇON EN 1970 WITH FUNCTIONAL

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/141000>; this version posted November 1, 2017. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.

3er Trimestre 2024

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

RECHERCHES DÉVELOPPEMENT DE NOUVEAUX AVANCE THÉMATIQUES

DEPTO. DE LA UNIVERSIDAD

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

Carles Director de Planificació Desenvolup i Esports

Telephone 2933 794499

Correspondence: Dr. J. A. J. van't Hof-Grootenboer, Department of Clinical Chemistry, University Hospital Groningen, P.O. Box 30.001, 3000 RB Groningen, The Netherlands. Tel.: +31 (0) 931 304545; Fax: +31 (0) 931 304546; E-mail: j.a.j.van't.hof-grootenboer@azg.umcg.nl

¹ Cargo Jefe de Departamento de Proyectos Estratégicos

Telephone: 9833 6756-50

Canoe: web@cs.cmu.edu dot project@cs.cmu.edu ma

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

CONCLUSÃO

54575-19500

Info: 02 57 49 41 41 - info@gruppoimn.it
 Tutti dal lunedì al venerdì 9h - 18h

Mrs. Adeline Ziegler, Mrs.
Mrs. de Kars-aid, De-anville ;

Elaborado por: **Elaborado por: [illegible]**

¹ <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs104/en/>

23. Ըստ այս պատկերի աղյուսակի և ձևերի հարցեր և լրացան են շահագործողները:

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

2024

BASECULO FISCAL DEL TERCER
QUINTO DE RECURSO

FAM

FONDO DE ASIGNACIONES MULTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta
3er. Trimestre 2024

Fecha de elaboración: 07/10/2024

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD 2 Nombre de la obra 2da. Etapa de construcción de la Biblioteca Comunitaria y obra complementaria Unidad Académica de Villa Tamulté de las Sabanas, Centro.

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO


CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



PROYECTO DE OBRAS

25%



Dirección Financiera CAMPUS Tamulté de las Sabanas, Carretera Arroyo la Culebra borde izquierdo, entre Ejido Alambrado y Ejido Jolochero s/n. Villa Tamulté de las Sabanas, Centro, Tabasco, C. P. 86250

FOTOS



1



2



3



4



5

Observaciones:

Se observaron:

Jefe del Departamento de Proyectos Estratégicos

Director de Planeación y Desarrollo Institucional

Muro Alario Román Pérez Pared

Nota:
*Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para el equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2024

LUGUERO, A. G. G. G.
GRUPO 1, MÓDULO 1**FAM**
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y MARKETINGDIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INVESTIGACIÓN
DIRECCIÓN DE PORTAFOLIO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO DE CALIDAD INSTITUCIONAL DE ADMINISTRACIÓN PARA FOMENTO

Trimestre y año del reporte

3er. Trimestre 2024

Fecha de emisión del reporte: 07/09/2024

REPORTE DESCRIPTIVO DEL BUQUE DE AVANCE TRIMESTRAL

(DATOS DE LA UNIVERSIDAD)



Nombre: Universidad Intercultural del Estado de Tabasco

Código Institucional: Tabasco

Código del Proyecto: 000000

Nombre del Responsable: Adriana Jiménez Miranda

Cargo: Directora de Planeación, Desarrollo y Evaluación

Teléfono: 9933 766000

Correo electrónico: direccion@uniat.com.mx

NOMBRE DEL PROYECTO

Obras y Mantenimiento

Nombre del Responsable: Ana Guadalupe Vega Hernández

Cargo: Jefe de Departamento de Proyectos e Investigación

Teléfono: 9933 976630

Correo electrónico: dpt.proyectos@uniat.com.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OTRA CONCLUIDA

Identificación del Proyecto (Código de Proyecto y Sub-Proyecto)	Nombre del Proyecto	Tipo de Proyecto					CONTRATO Y CALIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA					Monto Ejecutado (D)	Monto Pagar (E) + (F) + (G)	Bases de Datos y Seguimiento (Seguimiento de la Obra)			Terceros (Terceros)		Observaciones	Monto a Pagar (H)			Monto a Recibir (I)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		Tipo de Proyecto	Monto Estimado (A)	Monto Contratado (B)	Fecha Programada	Monto Contratado (C)	Monto a Pagar (D)	Monto a Recibir (E)	Monto a Pagar (F)	Monto a Recibir (G)	Monto a Pagar (H)			Monto a Recibir (I)	Monto a Pagar (J)	Monto a Recibir (K)	Monto a Pagar (L)	Monto a Recibir (M)		Monto a Pagar (N)	Monto a Recibir (O)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1	Sta. Etapa del Centro de Integración y Recreación Intercultural y obra complementaria en la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, Ocosingo, Yucatán.	2	1,784,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

Ana Guadalupe Vega Hernández
Jefe del Departamento de Proyectos e InvestigaciónAna Guadalupe Vega Hernández
Jefe del Departamento de Proyectos e InvestigaciónAna Guadalupe Vega Hernández
Jefe del Departamento de Proyectos e Investigación

1. Se considerará que el proyecto se ha ejecutado si se ha cumplido con el 100% de las actividades programadas.

2. Si el proyecto se ha ejecutado con un porcentaje menor al 100%, se considerará que el proyecto se ha ejecutado con un porcentaje menor al 100%.

3. Si el proyecto se ha ejecutado con un porcentaje menor al 100%, se considerará que el proyecto se ha ejecutado con un porcentaje menor al 100%.

2024

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES
FAM

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta

3er. Trimestre 2024

Fecha de elaboración: 07/09/2024

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

NOMBRE DE LA OBRA

PRIORIDAD

Nombre de la obra

Sta. Etapa del Centro de Integración y Recreación Intercultural y obra complementaria en la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, Oxolotán, Tacotalpa.



Porcentaje de avance

0%


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

Dirección:
Postal: CAMPUS Oxolotán, Carretera Oxolotán - Tacotalpa km 1 s/n, frente a la Secundaria Técnica No. 23, Poblado Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco, C.P. 86890

FOTOS



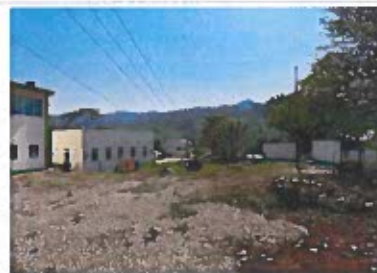
1



2



3

Arq. [Signature] Vega Martínez
Jefe del Departamento de Proyectos ArquitectónicosMtro. [Signature] Ramos Pérez Páez
Director de Fortalecimiento Institucional y InfraestructuraMtro. Adolfo Ramos Pérez Páez
DIRECTOR

Observaciones:

En proceso de asignación por parte de Intercu Tabasqueño de Infraestructura Física Educativa (ITIFE)

NOTA

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.
