

Oficio No. **UIET/REC/009/2025**

Asunto: **El que se indica**

Poblado Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco, 09 de enero de 2025

DR. EDUARDO GERARDO ROSAS GONZÁLEZ
DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
PRESENTE.-

Por medio de presente envío el informe de avances correspondientes al Cuarto Trimestre Octubre/Diciembre del Programa Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) ejercicio 2024, de los siguientes proyectos:

P1. 2da. Etapa de construcción de la Biblioteca Comunitaria y obra complementaria Unidad Académica de Villa Vicente Guerrero, Centla.

P2. 2da. Etapa de construcción de la Biblioteca Comunitaria obra complementaria Unidad Académica de Villa Tamulté de las Sabanas, Centro.


P3. 5ta. Etapa del Centro de Integración y Recreación Intercultural y obra complementaria en la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, Oxolotán, Tacotalpa.

Con la finalidad de atender a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos asignados. Anexo al presente se envía la documentación en formatos PDF y Excel.

Sin otro particular reciba un cordial saludo.

Atentamente

"SABER Y HACER PARA ENGRANDECER NUESTROS PUEBLOS"



Mtro. Alterio Ramos Pérez Pérez
Rector



C.c.p. Mtra. Adriana Jiménez Miranda.- Directora de la División de Planeación, Desarrollo y Evaluación de la UIET.
Arq. Elena Guadalupe Vega Narváez, Jefa del Departamento de Proyectos Estratégicos UIET
Archivo ARPP/lor*

2024

FAM
FUNDACIÓN DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO PARA CALIFICACIÓN DE PERSONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta
4to. Trimestre 2024

Código de institución 07016303

Informe de Ejecución de Proyectos
del FOM de la Infraestructura

Nombre: Universidad Intercultural del Estado de Tabasco
Código del Proyecto: 07016303-2024-050824-24C225
Clave del Proyecto: 050824-24C225

Proyecto: Construcción de Biblioteca y Biblioteca Comunitaria en Villavieja Cuarrero, Campeche.

Nombre del Responsable del Proyecto: Mtro. Adalberto Rodríguez Velasco
Cargo: Director de Fortalecimiento Institucional
Telefono: 9933 765992
Correo electrónico: adalberto.velasco@uait.edu.mx

Nombre del Responsable de Seguimiento: Mtro. José María Rodríguez Velasco
Cargo: Jefe de Departamento de Proyectos Estratégicos
Telefono: 9933 876630
Correo electrónico: josemaria.velasco@uait.edu.mx

Identificación del proyecto	Tipo de proyecto	Monto autorizado (Q)	CONTRATO Y CALIFICADO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA				Monto ejecutado (Q)	Recurso ejecutado (Q)	Bases Administrativas (Programas de la Institución)			Acciones que surgen de la ejecución	Fechas Periodo		Observaciones	Situación de la TSCU			Acta						
			Períodos Programados		Monto Contratado (P)	Contrato			Monto de Contratación (Obreros y Materializado y Construcción)	Monto del Ejecutado	Ejercido		Monto Cumplido	Inicio		Termino	Tipo de Contrato	Fecha de inicio	Fecha de entrega	Fecha de recepción	Fecha de acta	Acta Administrativo de Entrega-Recepción (Forma de DCLSU)	Fecha		
			Inicio	Termino																				Inicio	Termino
1	Ej. de construcción de la Biblioteca Comunitaria y obra complementaria Unidad Académica de Villavieja Cuarrero, Campeche.	\$ 8,375,702.00	050824	24C225	\$ 8,375,701.89	CONSTRUYENDO	\$ 8,375,701.24	\$ 0.65	48.00	4.62	26.56	100%	05/08/24	11/27/24	Conclusión de edificio	100%	05/08/24	11/27/24	De acuerdo a invitación de Puerto Tuxtla por parte de la Infraestructura Física Educativa, a Secretaría de Desarrollo Territorial y Obras Públicas por parte de la encargada de los procesos relacionados con la obra						
		\$ 8,375,702.00			\$ 8,375,701.89		\$ 8,375,701.24	\$ 0.65	48.00	4.62	26.56														

Aprobado por: Mtro. Adalberto Rodríguez Velasco
Cargo: Director de Fortalecimiento Institucional

Aprobado por: Mtro. José María Rodríguez Velasco
Cargo: Jefe de Departamento de Proyectos Estratégicos

1 Los datos se basan en los datos que se reportan en el FOM y en los datos que se reportan en el FOM.
2 El monto de ejecución de la obra se reporta en el FOM y en los datos que se reportan en el FOM.
3 La información que se reporta en el FOM es la información que se reporta en el FOM.

2024

SECRETARÍA FEDERAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA

FAM





FONDO DE AYUDAS MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta
4to. Trimestre 2024


Fecha de elaboración: 07/07/2025

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

 <p>Porcentaje de avance</p> <p>100%</p>	<p>PRIORIDAD: 1</p> <p>Nombre de la obra: 2da. Etapa de construcción de la Biblioteca Comunitaria y obra complementaria Unidad Académica de Villa Vicente Guerrero, Centla.</p>	<p>GEORREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO</p> 	<p>CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO</p> 	<p>UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS</p>  <p>Dirección Postal: CAMPUS Vicente Guerrero, Calle Mariano Matamoros s/n entre calle Gregorio Méndez Magaña, Villa Vicente Guerrero, Centla Tabasco, C.P. 86761</p>
	FOTOS			



1

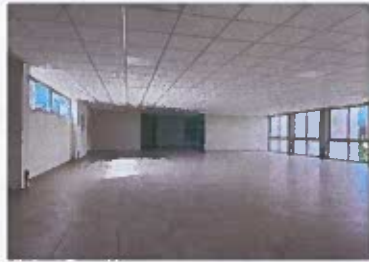

2

Observaciones:
Derivado de la creación del Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa, la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas será el ente encargado de los procesos relacionados con la obra



3



4



5


Arq. Blas Hernández Vega
Jefe del Departamento de Proyectos Estratégicos


Mtra. Adriana Zúñiga
Directora de Planeación Institucional


Mtra. Arlette Ramos Pérez
Directora

NOTA:
* Es muy importante que se anexa reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrá copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial se recomienda que se capture o filme toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra

2024

FAM

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL

4to. Trimestre 2024

REPÚBLICA DE GUATEMALA MINISTERIO DE EDUCACIÓN UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TEBECOS



Nombre: Universidad Intercultural del Estado de Tebecos

Nombre: MSc. Soledad Blandina Méndez

Nombre: Sr. Boris Cabiliano Viegas Morales

DETALLE DE ÁMBITO DE PROYECTOS

Table with columns for Project Name, Type of Project, Contract Calendar, Amounts, Specifics, and Observations. Includes a detailed breakdown of costs and a 'GLOBAL DEL PROYECTO' summary row.

1. Se requiere un depósito que cubra el 50% de presupuesto... 2. Este contrato es suscrito en forma previa y expresa... 3. El monto máximo de facturas es igual al presupuesto...

2024

EXPOSICIONAL Y EN EL QUE OFERDO EL RECIBO

FAM

FONDO DE APORTACIONES EN OBRAS

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta

4to. Trimestre 2024

Fecha de elaboración: 07/02/2025

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

<p>LOCALIZACIÓN OBRAS</p>  <p>Porcentaje de avance</p> <p>74%</p>	<p>PRIORIDAD 2</p> <p>Nombre de la obra: 2da. Etapa de construcción de la Biblioteca Comunitaria y obra complementaria Unidad Académica de Villa Tamulté de las Sabanas, Centro.</p> <p>GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO</p> 	<p>CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO</p> 	<p>UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS</p>  <p>Dirección Postal: CAMPUS Tamulté de las Sabanas, Carretera Arroyo la Culebra borde izquierdo, entre Ejido Almirado y Ejido Jolochoero s/n, Villa Tamulté de las Sabanas, Centro, Tabasco, C.P. 86250</p>
FOTOS			
 <p>1</p>	 <p>2</p>	<p>Observaciones: Derivado de la extinción del Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa, la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas será el encargado de los procesos relacionados con la obra</p>	
 <p>3</p>	 <p>4</p>		
<p><i>[Signature]</i> MSc. Diana Guzmán Rojas Rivas Jefa del Departamento de Proyectos Estratégicos OBRAS</p>	<p><i>[Signature]</i> MSc. Adrián Simón Méndez Director de Planeación Desarrollo e Innovación PLANEACIÓN</p>	<p><i>[Signature]</i> MSc. Abelardo Ramos Pérez Pérez OBRAS</p>	
<p><small>NOTA: * Es muy importante que se anexe reportes fotográficos de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se usan en copias tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y observaciones, en especial, se recomienda que se capture en el mismo tema, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra</small></p>			

2024



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
 DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN
 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN

Primer trimestre 2024
3er. Trimestre 2024

Fecha de emisión: 17/09/2024

RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN

CÓDIGO DEL PROYECTO



Nombre: Universidad Intercultural del Estado de Tabasco

Dirección: Calle 100, Tabasco

Código del Proyecto

Proyecto

Subproyecto

Nombre del Proyecto

Nombre del Proyecto: Sistema de Planeación, Desarrollo y Evaluación
 Cargo: Director de Planeación, Desarrollo y Evaluación
 Teléfono: 9833 766690
 Correo electrónico: dpe@uniat.edu.mx

Nombre del Responsable del Proyecto: Jorge Ramírez
 Cargo: Jefe de Departamento de Proyectos Estratégicos
 Teléfono: 9833 876430
 Correo electrónico: jorge.ramirez@uniat.edu.mx

DETALLE DEL ANÁLISIS DEL PROYECTO

Proyecto	Nombre del Proyecto	Tipo de Proyecto	Monto autorizado (A)	CONTRATO Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA							Gastos Recaudados (B) (Programado/Recaudado)			Observaciones	Avance del Proyecto			Actas			
				Fin. de la Contratación	Fechas Programadas		Monto Contratado (B)	Contratos	Monto de Contratos (C) (Diferencia a favor de Autoridad y Contratación C-A-B)	Monto a Pagar (D)	Recaudado (E) (F) (G)	Porcentaje del Estado (H)	Monto Contratado		Monto Recaudado	Observaciones	Porcentaje de Ejecución	Fecha de Ejecución	Fecha de Ejecución	Fecha de Ejecución	Fecha de Ejecución
					Inicio	Fin															
3	5to. Etapa del Centro de Integración y Reconstrucción Intercultural y otros complementarios en la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, Ciudad de Tacotalpa.	U	\$ 1,781,488.00	C007000706-000/0024	06/12/24	05/03/25	\$ 1,777,266.05	Facón Barnes García	\$ 1,791.15	\$ 58,318.06	\$ 1,209,408.79	100%	08/12/24	05/03/25	20%	08/12/24	05/03/25	05/03/25	05/03/25		
			\$ 1,781,488.00				\$ 1,777,266.05		\$ 1,791.15	\$ 58,318.06	\$ 1,209,408.79										

[Signature]
 Jefe del Departamento de Planeación, Desarrollo y Evaluación

[Signature]
 Director de Planeación, Desarrollo y Evaluación

[Signature]
 Jefe del Departamento de Proyectos Estratégicos

1. Se respalda el presente documento con el expediente del proyecto. Se podrán hacer todas las aclaraciones necesarias.
 2. El presente documento es informativo y no tiene carácter de presupuesto. No se podrá utilizar para ningún otro fin.
 3. El presente documento es informativo y no tiene carácter de presupuesto. No se podrá utilizar para ningún otro fin.

2024

INSTRUMENTO FISCAL EN EL QUE
SE INCORPORA EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta
4to. Trimestre 2024

Fecha de elaboración: 07/29/2024

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD 3 Nombre de la obra Sta. Etapa del Centro de Integración y Recreación Intercultural y obra complementaria en la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, Oxolotán, Tacotalpa.



Porcentaje de avance

20%


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección
Postal: CAMPUS Oxolotán, Carretera Oxolotán - Tacotalpa km 1 s/n, frente a la Secundaria Técnica No. 23, Poblado Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco, C.P. 86990

FOTOS



1



2

Observaciones:
Derivado de la extinción del Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa, la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas será el ente encargado de los procesos relacionados con la obra



3



4



5

APD. 
Ana Margarita Vega Martínez
Jefe del Departamento de Proyección Estratégica
OPMS

Mra. Adriana Jiménez Méndez
Directora de Planeación (Asesoría) y
PLANEACIÓN


Humberto Ramos Pérez
SECRETARÍA

NOTA
* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se aneja una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra
