

Oficio No. UIET/REC/322/2019

**Asunto:** El que se indica

Oxolotán, Tacotalpa Tabasco, 03 de septiembre de 2019.

**DRA. CARMEN E. RODRÍGUEZ ARMENTA**  
DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DGESU/SES.  
CIUDAD DE MÉXICO  
PRESENTE. -


**AT'N. MARÍA DEL ROCIO CHAVEZ MAYO**  
SUBDIRECTORA DE FOMENTO INSTITUCIONAL  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Por medio del presente, envío el informe del mes de agosto 2019, correspondiente al programa del **Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2019** con la finalidad de atender a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos federales asignados.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

**Atentamente**

*"SABER Y HACER PARA ENGRANDECER NUESTROS PUEBLOS"*



**Mtra. Adela Méndez Martínez**  
Rectora



C.c.p. Mtra. Beatriz Rodríguez Sánchez.- Encargada del Despacho de la Coordinación Administrativa de la CGEIB  
Mtra. María de los Ángeles Gordillo Castañeda .- Directora de Educación Media Superior y Superior CGEIB-SEP  
Mtra. Adriana Jiménez Miranda.- Directora de la División de Planeación, Desarrollo y Evaluación UIET.  
Arq. Emmanuel Hernández Espinosa.- Jefe del Depto. de Proyectos Estratégicos.  
Archivo/minutario.  
AMM/lor\*

2019

AÑO



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

ago-2019

FECHA DE CORTE: 31/08/2019

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: Universidad Intercultural del Estado de Tabasco

Entidad federativa: Tabasco

Clave Inst 911: 27MSU0009H

Nombre: Mtra. Adilma Jiménez Miranda  
Cargo: Directora de la División de Planeación, Desarrollo y Evaluación  
Teléfono: 9832 765800  
Correo electrónico: general.ara@gmail.com

Nombre: Arq. Emmanuel Hernández Espinosa  
Cargo: Jefe del Departamento de Proyectos Estratégicos  
Teléfono: 0931 302154  
Correo electrónico: proyectos.uei@outlook.com

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto			Acciones que sustentan el avance	Acciones por realizar	% de avance	Fechas		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causa)	Si ya fue inaugurada								
		Obra de conservación	Equipamiento	Actualización y mejoras	Manejo de residuos				Proyecto innovador	Espediente/equipo	cantidad				metros cuadrados	Inicio			Término	Entrega- Recepción (Acta Inauguro)	Acta Administrativa de Entrega- Recepción	Monto de Acta Administrativa					
1	Construcción de la segunda etapa del Edificio 1 del Edificio Académico tipo II, en la Unidad Académica de Villa Tamulté de las Sabanas.	X				\$ 2,378,432.57	\$	\$ 2,378,432.57	AULAS	3	135.00	Pendiente	Licitación, Construcción	0%	10/09/19	26/11/19	En convenio con el Instituto Tabasqueño de Infraestructura Física Educativa y la Secretaría del Educación del Estado, se acordó iniciar la obra en septiembre del presente año. Actualmente se avanza en la construcción esperando un recurso convenido con el Gobierno del Estado.										
								SANITARIOS	1	45.00																	
								PASILLOS	2	135.00																	
								<b>TOTAL</b>	<b>6</b>	<b>315.00</b>																	

M.A.P. Adilma Jiménez Miranda  
Nombre y firma del Titular de la IES

Arq. Emmanuel Hernández Espinosa  
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Avance del recurso autorizado, no confundir con avance total del proyecto/edificio.  
 1 Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anotar tanto las como sea necesario.  
 2 En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.  
 3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

2019

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

ago-2019

FECHA DE CORTIL: 31/08/2019

REPORTÉ FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIMORDIAL

1

Nombre de la obra:


Construcción de la segunda Etapa del Edificio Académico tipo II de la Unidad Académica de Villa Tamulté de las Sabanas, Centro.



Porcentaje de avances

0%

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

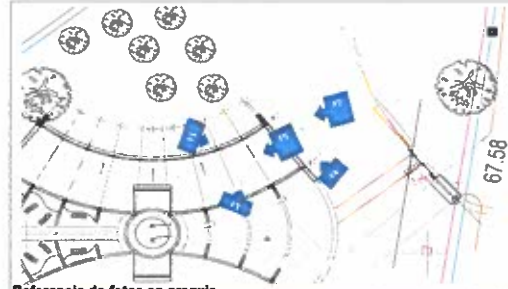

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



FOTOS



F3: Fachada principal



F2: Entrada



F1: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

Comentarios de los trabajos realizados:

En conjunto con el Instituto Tabasqueño de Infraestructura Física Educativa y la Secretaría del Educación del Estado, se acuerda iniciar la obra en Septiembre del presente año. Actualmente se avanza en la construcción ejerciendo un retardo convenido con el Gobierno del Estado

IMÁGENES DEL ESTADO ACTUAL

M.A.P. Adela Sánchez Martínez  
Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Emmanuel Hernández Figueroa  
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.
