

Oficio No. UIET/REC/444/2019

**Asunto:** El que se indica

Oxolotán, Tacotalpa Tabasco, 06 de diciembre de 2019.

**DRA. CARMEN E. RODRÍGUEZ ARMENTA**  
DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DGESU/SES.  
CIUDAD DE MÉXICO  
PRESENTE. -

**AT'N. MARÍA DEL ROCIO CHAVEZ MAYO**  
SUBDIRECTORA DE FOMENTO INSTITUCIONAL  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Por medio del presente, envío el informe del mes de noviembre 2019, correspondiente al programa del **Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2019** con la finalidad de atender a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos federales asignados.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

**Atentamente**

*“SABER Y HACER PARA ENGRANDECER NUESTROS PUEBLOS”*



**Mtra. Adela Méndez Martínez**  
Rectora



C.c.p. Mtra. Beatriz Rodríguez Sánchez.- Encargada del Despacho de la Coordinación Administrativa de la CGEIB  
Mtra. María de los Ángeles Gordillo Castañeda .- Directora de Educación Media Superior y Superior CGEIB-SEP  
Mtra. Adriana Jiménez Miranda.- Directora de la División de Planeación, Desarrollo y Evaluación UIET.  
Archivo/minutario.  
AMM/lor\*

2019

AÑO

**FAM**

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

nov-2019

FECHA DE CORTE: 30/11/2019

**REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL**

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: **Universidad Intercultural del Estado de Tabasco**

Entidad federativa: Tabasco

Clave Inst 911: 27MSU0009N

RESPONSABLES

Planeación

Nombre: Mtra. Adriana Jiménez Miranda  
Cargo: Directora de la División de Planeación, Desarrollo y Evaluación  
Teléfono: 9933 765690  
Correo electrónico: c.general.oxo@gmail.com

Obras y Mantenimiento

Nombre: Mtra. Adriana Jiménez Miranda  
Cargo: Directora de la División de Planeación, Desarrollo y Evaluación  
Teléfono: 9933 765690  
Correo electrónico: c.general.oxo@gmail.com, dir.planeacion@uiet.edu.mx



DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto					Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto <sup>1</sup>			Acciones que sustentan el avance <sup>2</sup>	Acciones por realizar	% de avance*	Fechas <sup>3</sup>		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas						
		Obras de continuidad	Equipoamiento	Adecuaciones y mejoras	Mantenimiento	Proyecto sustentable				Espacio/equipo	cantidad	metros cuadrados				Inicio	Término			Entrega-Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega-Recepción	Monto de Acta Administrativa						
																							¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?				
1	Construcción de la segunda etapa del Edificio 1 del Edificio Académico tipo II, en la Unidad Académica de Villa Tamulté de las Sabanas.	X					\$ 2,378,432.57	\$ 1,193,279.19	\$ 1,185,153.38	AULAS	3	135.00	Trabajos de aplanado y obra exterior	Construcción	77%	11/10/19	24/12/19	La obra se inició de acuerdo a lo emitido por el Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa (ITIFE). Existe una diferencia entre el avance físico y (77%) y el avance financiero (52%), de acuerdo al reporte emitido por el ITIFE, en virtud de los pagos pendiente de estimación, previstos en la normatividad correspondiente.										
					SANITARIOS	1	45.00																					
					PASILLOS	2	135.00																					
					<b>TOTAL</b>	<b>6</b>	<b>315.00</b>																					
							<b>\$2,378,432.57</b>	<b>\$1,193,279.19</b>	<b>\$1,185,153.38</b>																			

M.A.P. Adela Méndez Martínez  
Nombre y firma del Titular de la IES

Mtra. Adriana Jiménez Miranda  
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Avance del recurso autorizado, no confundir con avance total del proyecto/edificio.

<sup>1</sup> Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta filas como sea necesario.

<sup>2</sup> En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.

<sup>3</sup> Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

2019

AÑO

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

nov-2019

FECHA DE CORTE: 30/11/2019

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD

1

Nombre de la obra:

Construcción de la segunda Etapa del Edificio Académico tipo II de la Unidad Académica de Villa Tamulté de las Sabanas, Centro.




Escudo de la universidad

Porcentaje de avance


77%

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

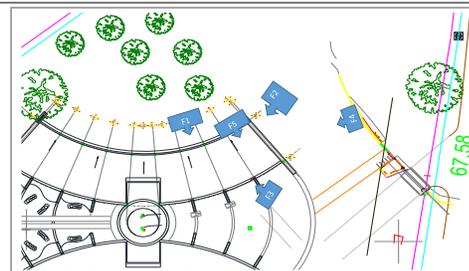

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

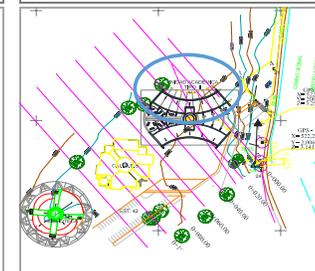

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: lateral



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

Comentarios de los trabajos realizados:

La obra se inició de acuerdo a lo emitido por el Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa (ITIFE). Existe una diferencia entre el avance físico y (77%) y el avance financiero (52%), de acuerdo al reporte emitido por el ITIFE.

De igual forma se están llevando a cabo los trabajos del Proyecto: 19UIET01, con una inversión contratada de \$3,304,242.98 y un avance físico del 100%, de acuerdo al reporte emitido por el ITIFE.

IMÁGENES DEL ESTADO ACTUAL

M.A.P. Adela Méndez Martínez  
Nombre y firma del Titular de la IES

Mirra Adriana Jiménez Miranda  
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.
