

Oficio: UIET/REC/027/2026.

Asunto: Informe cuarto trimestre FAM 2025

Poblado de Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco, a 12 de enero 2026.

MTRA. CYNTHIA RUANO MÉNDEZ

DIRECTORA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL

PRESENTE.-

Por medio de presente envío el informe de avances correspondientes al cuarto trimestre octubre/diciembre del Programa Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) ejercicio 2025, de los siguientes proyectos:

Prioridad 1. Adquisición de equipamiento y mobiliario en la Unidad Académica Villa Vicente Guerrero, Centla.

Prioridad 2. Adquisición de equipamiento y mobiliario en la Unidad Académica Villa Tamulté de las Sabanas, Centro.

Prioridad 3. 3ra. Etapa Construcción de la Biblioteca Comunitaria y Obra Complementaria en la Unidad Académica Villa Tamulté de las Sabanas, Centro.

Prioridad 4. 6ta. Etapa de Construcción del Centro de Integración y Recreación Intercultural, Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, Oxolotán, Tacotalpa.

Prioridad .5 1ra. Etapa de Construcción del Centro Universitario de Atención Integral a la Salud, Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, Oxolotán, Tacotalpa.


Con la finalidad de atender a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos asignados.

Anexo al presente se envía la documentación en formatos PDF y Excel.

Sin otro particular reciba un cordial saludo.

Atentamente

“SABER Y HACER PARA ENGRANDECER NUESTROS PUEBLOS”



Mtro. Alterio Ramos Pérez Pérez
Rector



C.c.p. Archivo ARPP/lor*

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE
OTORGÓ EL REGISTRO**FAM**
FONDO DE APOYOS ECONÓMICOSDIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta

4to. Trimestre 2025

Fecha de elaboración: 09/01/2026

APORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: Universidad Intercultural del Estado de Tabasco

Entidad federativa: Tabasco

Código: 911: 274000009

Nombre Mtro. Adriano Jiménez Miranda

Cargo: Director de Planeación, Desarrollo y Evaluación

Teléfono: 913 760400

Correo electrónico: adrianajim@unet.edu.mx

Presidente

Rector

Obras y Mantenimiento

Nombre: Arq. Elena Guadalupe Vega Méndez

Cargo: Jefa de Departamento de Proyectos Estratégicos

Teléfono: 913 479630

Correo electrónico: elena.vega@unet.edu.mx

UNIDAD DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRAS Y MANTENIMIENTO

DETALLE DEL AVANCE DEL PROYECTO										OBSERVACIONES										OBSERVACIONES						
Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto	Monto Reautorizado [A]	CONTRATO Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA				Monto ejecución [D]	REMANENTES		Espacios físicos/equipamiento (programado/autorizado)				Acciones que se realizarán en el ejercicio	Fecha de Realización (DD/MM/AAAA)		Observaciones	Resumen a la TESOF			Actas				
				No. (1) de Contrato (1)	Fechas Programadas		Monto Contratado (B)		Contratista	Monto no contratado (C) Diferencia entre el reautorizado y el Contratado C=A-B	(E1) Remanente entre el monto reautorizado y el monto ejercido -A-D	(E2) Diferencia entre el monto contratado y el monto ejercido -E1-B	Nombre del Espacio/equipamiento	Cantidad		Métro. Cuadrados (m²)	Inicio		Termino	Línea de Captura	Fecha de pago	Importe	Entrega (Acta de Recepción) MONTO	Fecha	Acta Administrativa de Entrega- Recepción (Formulario DESU) MONTO	Fecha
					INICIO	TERMINO																				
I	Adquisición de equipamiento y mobiliario en la Unidad Académica Villa Vicente Guerrero, Centro.	X	\$ 1,929,002.21	CV07-14/2025	11/11/25	10/12/25	\$ 876,217.60	COMERCIALIZADOR A. SOSA, S.A. DE C.V.	\$	6,281.26	\$ 1,922,739.95	\$ 6,281.26	\$	Villa de la Cruz	34.00				GLOBAL DEL PROYECTO							
				CV07-16/2025	18/11/25	17/12/25	\$ 224,700.12	GERARDO CORREA GARCIA					Mesa triangular	20.00												
				CV07-18/2025	01/12/2025	31/01/2026	\$ 89,324.64	COMERCIALIZADOR A. SOSA, S.A. DE C.V.					Pizarra de vidrio	2.00												
				CV07-17/2025	01/12/2025	31/01/2026	\$ 89,324.64	COMERCIALIZADOR A. SOSA, S.A. DE C.V.					Almuerzo	140.00												
				CV07-26/2025	01/12/2025	31/01/2026	\$ 349,559.55	PLANEA ASOCIACIÓN DE BARRIO INDIO					Poltronas	2.00												
				CV07-25/2025	01/12/2025	31/01/2026	\$ 293,113.24	PLANEA ASOCIACIÓN DE BARRIO INDIO					Libros	9.00												
II	Adquisición de equipamiento y mobiliario en la Unidad Académica Villa Tamulté de las Sabanas, Centro.	X	\$ 1,929,000.00	CV07-14/2025	11/11/25	10/12/25	\$ 876,217.60	COMERCIALIZADOR A. SOSA, S.A. DE C.V.		6,281.26	\$ 1,922,739.95	\$ 6,281.26	\$	Villa de la Cruz	34.00				GLOBAL DEL PROYECTO							
				CV07-16/2025	18/11/25	17/12/25	\$ 224,700.12	GERARDO CORREA GARCIA					Mesa triangular	20.00												
				CV07-18/2025	01/12/2025	31/01/2026	\$ 89,324.64	COMERCIALIZADOR A. SOSA, S.A. DE C.V.					Pizarra de vidrio	2.00												
				CV07-17/2025	01/12/2025	31/01/2026	\$ 89,324.64	COMERCIALIZADOR A. SOSA, S.A. DE C.V.					Almuerzo	140.00												
				CV07-26/2025	01/12/2025	31/01/2026	\$ 349,559.55	PLANEA ASOCIACIÓN DE BARRIO INDIO					Poltronas	2.00												
				CV07-25/2025	01/12/2025	31/01/2026	\$ 293,113.24	PLANEA ASOCIACIÓN DE BARRIO INDIO					Libros	9.00												
III	3ra. Etapa Construcción de la Biblioteca Comunitaria y Obras Complementarias en la Unidad Académica Villa Tamulté de las Sabanas, Centro.	X	\$ 2,000,000.00	CO07001073-206/2025	28/10/25	31/12/25	\$ 1,949,648.18	CONSTRUCCION ESABO, S.A. DE C.V.	\$	50,350.82	\$ 209,986.46	\$ 1,790,013.34	\$ 1,739,662.72	Biblioteca	1.00	191.53										
												Catálogos	2.00	7.80												
													Oficina Administrativa	1.00	15.00											
													Talleres	1.00	25.56											
													Vestibulo	1.00	24.20											
IV	6ta. Etapa de Construcción del Centro de Integración y Recreación Intercultural, Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, Ocosingo, Tuxtla.	X	\$ 772,100.00	CO07001074-217/2025	31/10/25	30/12/25	\$ 756,432.26	SANTA ANNA SERVICIOS TECNICOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	\$	15,667.74	\$ 756,432.26	\$ 15,667.74	\$	Pista estudiantil	1.00	222.00										
V	1ra. Etapa de Construcción del Centro Universitario de Atención Integral a la Salud, Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, Ocosingo, Tuxtla.	X	\$ 8,160,731.00	CO07001090-206/2025	28/10/25	28/12/25	\$ 7,955,380.41	INGENIERIA FUSMA, S.A. DE C.V.	\$	8,160,731.00	\$ 0	\$		Laboratorio	14.00	816.00										
				CO07001090-206/2025CON	28/12/25	31/01/26	\$ 205,350.59						Salud	5.00	73.00											

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE
OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCUTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:

4to. Trimestre 2025

Fecha de elaboración: 09/01/2026

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

LOGO DE LA INSTITUCIÓN



Porcentaje de avance

95.00%

PRIORIDAD

1

Nombre de la obra: Adquisición de equipamiento y mobiliario en la Unidad Académica Villa Vicente Guerrero, Centla.


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

Dirección Postal: Vicente Guerrero, Calle Mariano Matamoros
s/n entre calle Gregorio Méndez Magaña, Villa Vicente
Guerrero, Centla, Tabasco., C.P. 86761

FOTOS



Observaciones:

EN ESPERA DE INSTALACIÓN

Ar. Elena Guadalupe Vega Noriega
Jefe del Departamento de Proyectos Estratégicos
OBRAS Y MANTENIMIENTOMtro. Altairio Ramos Pérez Pérez
Rector
RECTORÍAMtra. Adriana Jaramilla Méndez
Directora de Planeación, Desarrollo y Evaluación
PLANEACIÓN

NOTA:

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE
OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES




DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:

4to. Trimestre 2025

Fecha de elaboración: 09/01/2026

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

LOGO DE LA INSTITUCIÓN  Porcentaje de avance 95.00%	PRIORIDAD 2 Nombre de la obra: Adquisición de equipamiento y mobiliario en la Unidad Académica Villa Tamulté de las Sabanas, Centro.
	GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO 
UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS  Dirección Postal: Tamulté de las Sabanas, Carretera Arroyo la Culebra borde izquierdo, entre Ejido Alambrado y Ejido Jolochero s/n, Villa Tamulté de las Sabanas, Centro, Tabasco, C.P. 86250.	

FOTOS



Observaciones:
EN ESPERA DE INSTALACIÓN.




Arq. Elena González Vega Narváez
Jefe del Departamento de Proyectos Estratégicos
OBRAS Y MANTENIMIENTO


Mtro. Alterio Ramos Pérez Pérez
Rector
RECTORÍA


Mtra. Adriana Zamora Mijanguez
Directora de Planeación, Desarrollo y Evaluación
PLANEACIÓN

NOTA:

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE
OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES





DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCUTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:







4to. Trimestre 2025

Fecha de elaboración: 09/01/2026

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

<p>LOGO DE LA INSTITUCIÓN</p>  <p>Porcentaje de avance</p> <p>30.00%</p>	<p>PRIORIDAD 3 Nombre de la obra: 3ra. Etapa Construcción de la Biblioteca Comunitaria y Obra Complementaria en la Unidad Académica Villa Tamulté de las Sabanas, Centro.</p>	<p>UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS</p>  <p>Dirección Postal: Tamulté de las Sabanas, Carretera Arroyo la Culebra borde izquierdo, entre Ejido Alambrado y Ejido Jalochero s/n, Villa Tamulté de las Sabanas, Centro, Tabasco, C.P. 86250</p>	
	<p>GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO</p> 	<p>CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO</p> 	

FOTOS

		<p>Observaciones :</p> <p>LA OBRA FUE REFERENDADA POR LA SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS.</p>
		
		
<p>Arq. Elena Guadalupe Vega Hernández Jefe del Departamento de Proyectos Estratégicos OBRAS Y MANTENIMIENTO</p>	<p>Mtro. Atilio Ramos Pérez Pérez Rector RECTORÍA</p>	<p>Mrs. Adriana Jiménez Miranda Directora de Planeación, Desarrollo y Evaluación PLANEACIÓN</p>

NOTA

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE
OTORGO EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCUTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:

4to. Trimestre 2025

Fecha de elaboración: 09/01/2026

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

LOGO DE LA INSTITUCIÓN



Porcentaje de avance

90.00%

PRIORIDAD


4

Nombre de la obra: 6ta. Etapa de Construcción del Centro de Integración y Recreación Intercultural, Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, Oxolotán, Tacotalpa.


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

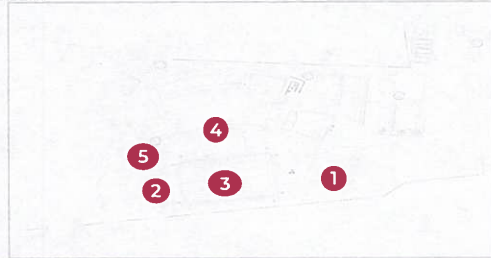

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal: Oxolotán, Carretera Oxolotán - Tacotalpa km 1 s/n, frente a la Secundaria Técnica No.23, Poblado Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco, C.P. 86890

FOTOS



Observaciones :

SE ENCUENTRAN POR FINALIZAR LOS TRABAJOS.



Arq. Elena Guadalupe Hernández
Jefe del Departamento de Proyectos Estratégicos
OBRAS Y MANTENIMIENTO

Mtro. Asierio Ramos Pérez Pérez
Rector
RECTORÍA

Mtro. Adrián Hernández Martínez
Directores de Planeación, Desarrollo y Evaluación
PLANEACIÓN

NOTA

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE
OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:

4to. Trimestre 2025

Fecha de elaboración: 09/01/2026

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

LOGO DE LA INSTITUCIÓN



Porcentaje de avance


90.00%

PRIORIDAD


5

Nombre de la obra: 1ra. Etapa de Construcción del Centro Universitario de Atención Integral a la Salud, Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, Oxolotán, Tacotalpa.

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

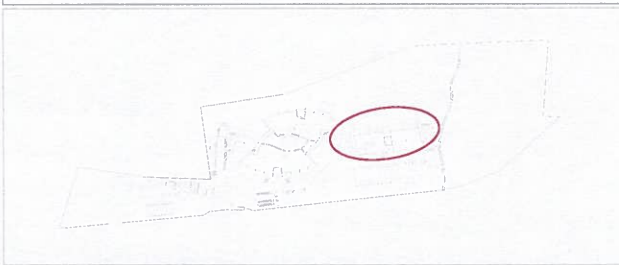

CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

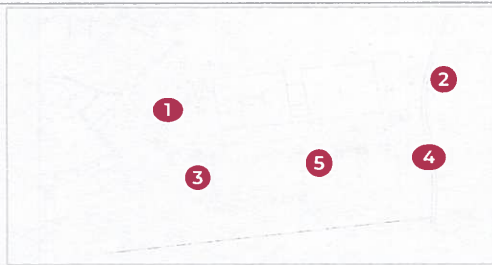UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS
REFERENCIADASDirección Postal: Oxolotán, Carretera Oxolotán - Tacotalpa km
1 s/n, frente a la Secundaria Técnica No. 23, Poblado Oxolotán,
Tacotalpa, Tabasco, C.P. 86890

FOTOS



Observaciones :

SE ENCUENTRAN POR FINALIZAR LOS TRABAJOS.

Arq. Eliana Guadalupe Vega Navárez
Jefa del Departamento de Proyectos Estratégicos
OBRAS Y MANTENIMIENTOMtro. Alterio Ramos Pérez Pérez
Rector
RECTORÍAMtra. Adriana Jiménez Méndez
Directora de Planeación y Desarrollo Institucional
PLANEACIÓN

NOTA
